LESY ČR

REALIZACE PROJEKTOVÝCH OPATŘENÍ LČR MOOREVITAL 2018 - POKRAČOVÁNÍ OCHRANY RAŠELINIŠŤ V KRUŠNÝCH HORÁCH

30. LEDEN 2020, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung. Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

SN CZ
Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020

Realizace projektu

Cíl projektu: provedení revitalizačních opatření na ploše 10 hektarů a opatření na ochranu tetřívka na ploše také cca 10 hektarů

Investor projektu : **Lesy České republiky, s. p.** organizační jednotka **LS Klášterec**

uzavřel v roce 2017 smlouvu o dílo s dodavatelem – firma DREDGER

Místo realizace: Novoveské rašeliniště, severní hranici tvoří vodní tok Chomutovka, porostní skupina 402 D11/6/2m

Zahájení práce: 1.8. 2018, ukončení práce: 15. 11. 2019

Předpokládané způsobilé výdaje projektu – celkem 226 000 euro (5,8 mil. Kč)

Dokončeno : 100 % výdajů na stavbu – 193 500 euro (5,0 mil. Kč)

V roce 2018 byly dokončeny tyto činnosti :

Geodetické práce před výstavbou – zaměření umístění hrazení v příkopech

Inženýrská příprava - plán BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví), havarijní a povodňový plán

Realizace provizorní komunikace s úpravou pláně o šířce 300 cm a (celková délka 1500 m)

Zemní práce k výstavbě hrazení – celkem 370 ks na délku řešených příkopů 4249 m

typ 1	Příčné přírodě blízké celozemní hrazení	233 kusů
typ 2	Příčné přírodě blízké celozemní hrazení s jednou dřevěnou stěnou, ve středu hrazení	124
typ 3	Příčné přírodě blízké srubové hrazení (dřevo) hrazení s výplní a obsypem zemin	13

Spotřeba fošen o tloušťce 35 mm – 32 m3

Zemní práce na plošná úpravě stržením drnu, odkopy a zpětném zasypání příkopů 5 560 m2

Realizace projektu

V roce 2019 byly dokončeny tyto činnosti :

- výstavba dvou oplocenek pro výsadbu vrb kolem svodných příkopů v částečně upravené ploše před výtokem do Chomutovky
- velká oplocenka pro ochranu stávajícího porostu břízy pýřité a náletových dřevin – celková oplocená plocha je cca 10 ha
- stavba 100 ks individuálních ochran (oplůtků) pro náletové dřeviny
- hloučkovitá výsadba vrby ušaté místní provenience v počtu 3 000 ks

Místo realizace projektu na lesnické mapě

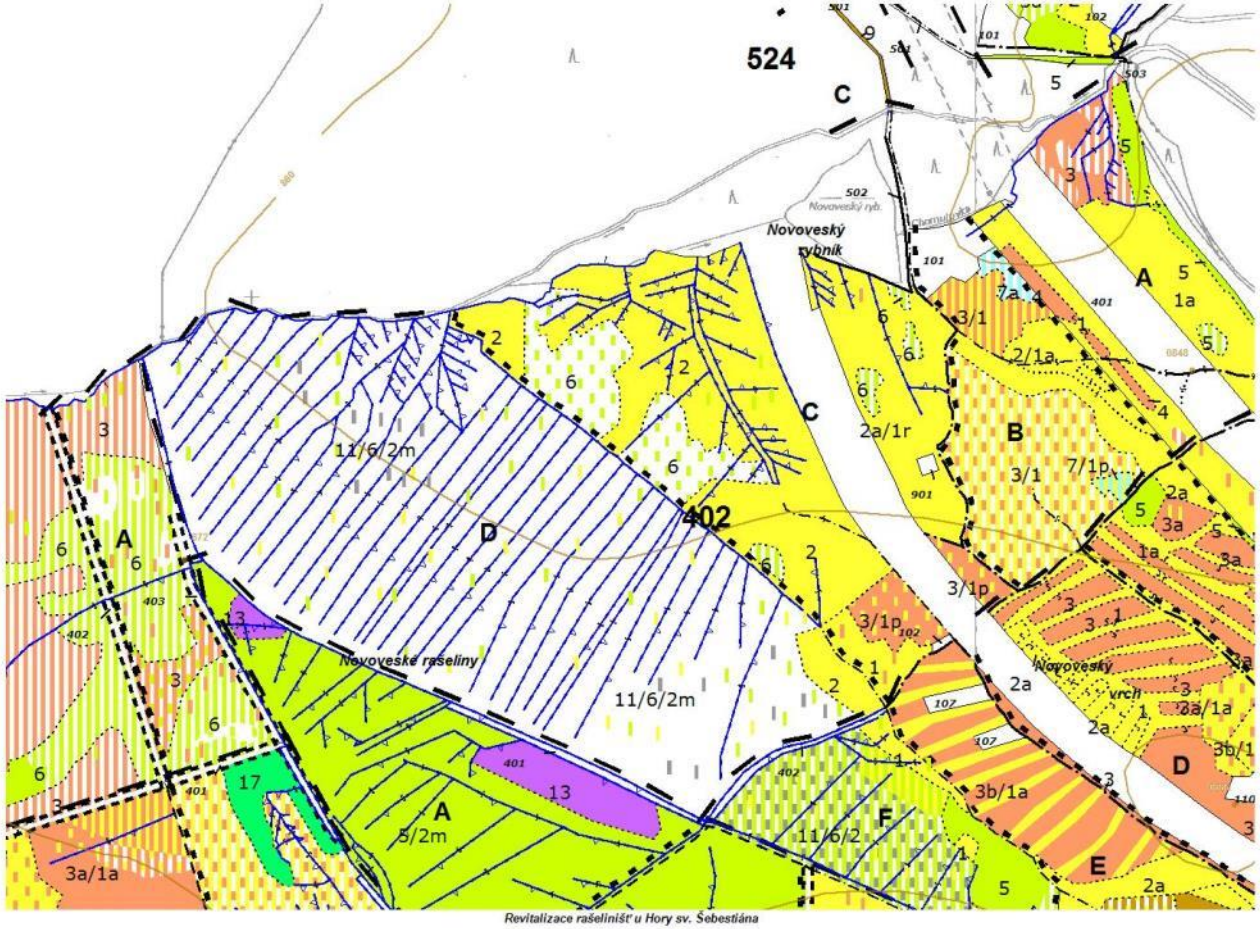

Umístění oplocenek v projektu

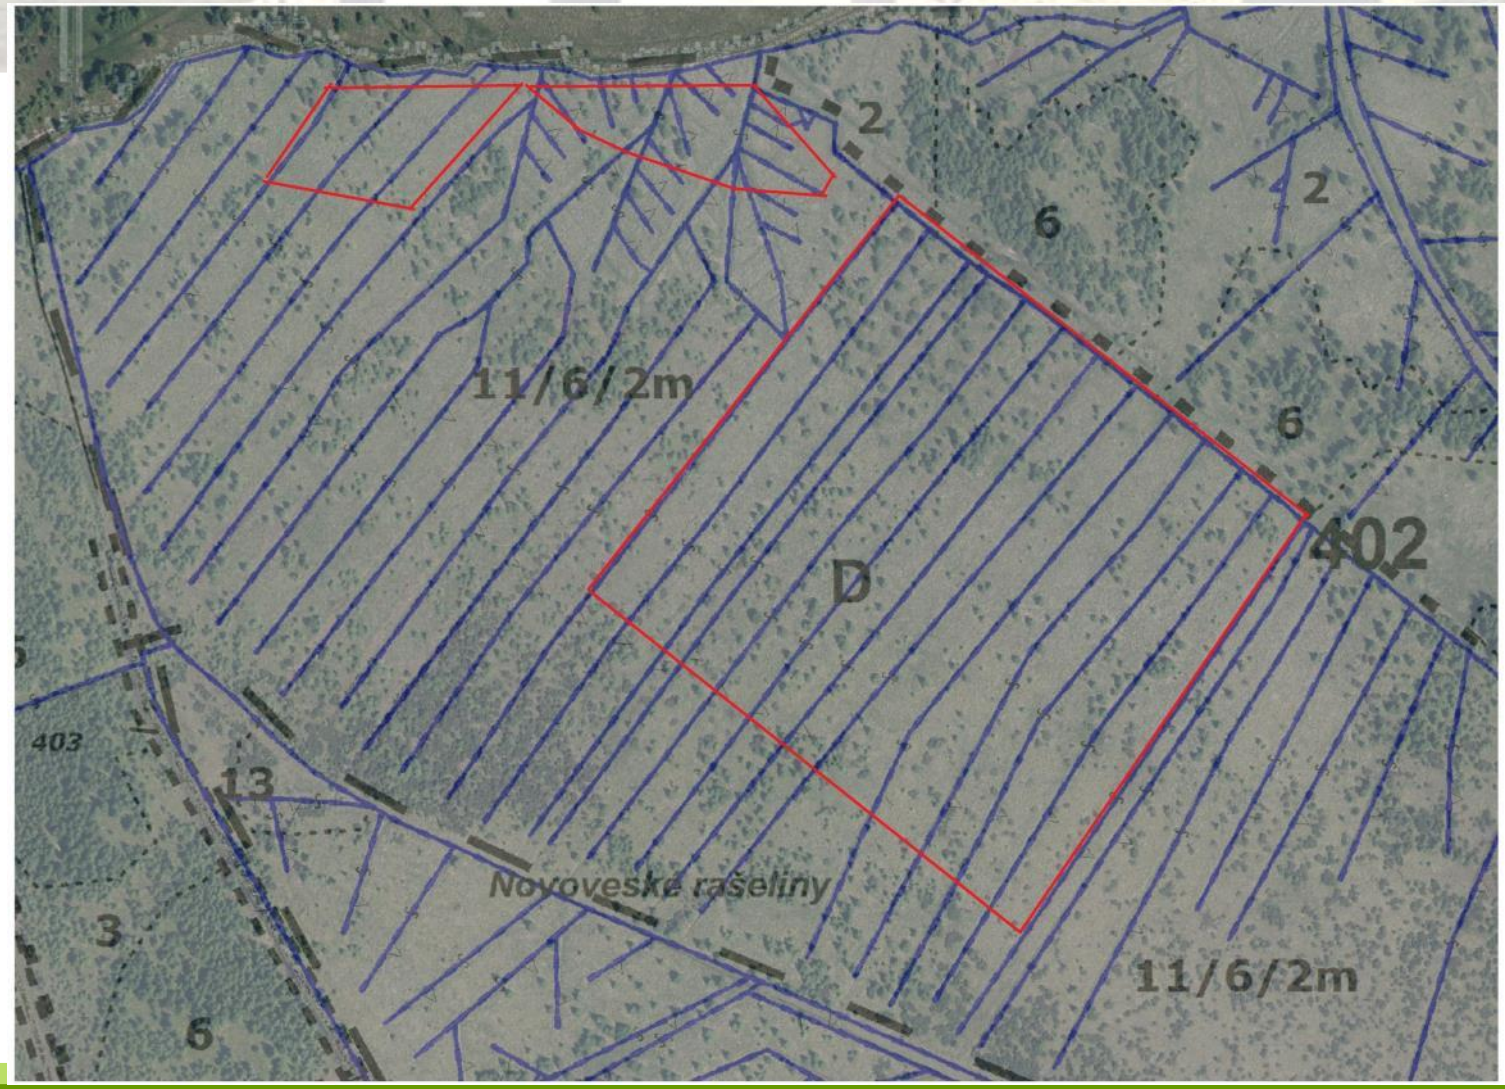

Fotodokumentace prací v roce 2018 – zpřístupnění pracoviště

Fotodokumentace prací v roce 2018 – dovoz materiálu

Fotodokumentace prací v roce 2018 – zemní práce

Fotodokumentace prací v roce 2018 – stavba hrazení

Fotodokumentace prací v roce 2018 – dokončená hrazení

Fotodokumentace prací v roce 2019 – dokončená hrazení

Fotodokumentace prací v roce 2018 – plošná úprava terénu

Fotodokumentace prací v roce 2019 – plošná úprava terénu

Fotodokumentace prací v roce 2018 - Dubové sloupy na stavbu oplocenek

Fotodokumentace prací v roce 2019 - Stavba oplocenek

Fotodokumentace prací v roce 2019 - Stavba oplůtků

Fotodokumentace prací v roce 2019 - Výsadba vrby ušaté

Fotodokumentace prací v roce 2019 - Výsadba vrby ušaté

Hrazení zadržely vodu v příkopech přes celé léto - stav září 2019
